

protocollo@pec.comune.orno.bs.it

Spettabile Comune di Borno
Piazza Giovanni Paolo II, 1
25042 Borno - BS

Oggetto: LAVORI DI “SOMMA URGENZA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERCOMUNALE OSSIMO – BORNO - PIANCOGNO, VIA NUOVA”.
CUP: G17H22001950006

Committente dei lavori: Comune di Borno

Stazione appaltante: Comune di Borno

Impresa appaltatrice: CO.E.F.” di Andrea Cottarelli &C. S.n.c., via Bernina n.40, Borno (Bs) – C.F. 02006250175 – P.I. 00671600989

Direttore dei Lavori: Ing. Marco Barbieri

Localizzazione dell'intervento: Strada intercomunale Ossimo-Borno-Piancogno

Con riferimento all'intervento in oggetto ed all'incarico ricevuto per la direzione dei lavori, contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione (determina n. 165 del 13.06.2022), nonché coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (determina n. 171 del 17/06/2022), in seguito all'avvenuta pubblicazione dell'avviso ad opponendum dal 31/08/2022 al 30/09/2022 senza osservazioni, in allegato trasmetto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti.

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
- Copia dei formulari ricevuti dalla ditta per l'avvenuto smaltimento dei materiali provenienti dalla demolizione e scavo
- Durc dell'impresa

Darfo Boario Terme 03 ottobre 2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco Barbieri

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82\2005 s.m.i. dal sottoscritto direttore dei lavori e dall'impresa, intendendo che l'impresa lo sottoscrive per le parti di competenza.

Dott. ing. Marco Barbieri – via Beato Innocenzo n. 11 – 25047 Darfo Boario Terme – BS
tel. cell. 339-7164592 – indirizzo e-mail: marco.barbieri4013@gmail.com
PEC: marco.barbieri12@ingpec.eu - Ordine ingegneri Brescia n° A2241

Oggetto: LAVORI DI “SOMMA URGENZA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERCOMUNALE OSSIMO – BORNO - PIANCOGNO, VIA NUOVA” CUP: G17H22001950006

Committente dei lavori: Comune di Borno

Stazione appaltante: Comune di Borno

Impresa appaltatrice: CO.E.F.” di Andrea Cottarelli &C. S.n.c., via Bernina n.40, Borno (Bs) – C.F. 02006250175 – P.I. 00671600989

Direttore dei Lavori: Ing. Marco Barbieri

Localizzazione dell'intervento: Strada intercomunale Ossimo-Borno-Piancogno

STATO FINALE DEI LAVORI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Darfo Boario Terme 03 ottobre 2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco Barbieri

() il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82\2005 s.m.i. dal sottoscritto direttore dei lavori e dall'impresa, intendendo che l'impresa lo sottoscrive per le parti di competenza.*

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

03 ottobre 2022

COMMITTENTE DEI LAVORI: Comune di Borno

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Borno

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Nicolini Francesco

DIREZIONE DEI LAVORI: Ing. Marco Barbieri – via Beato Innocenzo n. 11 – Darfo Boario Terme – BS

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE: Ing. Marco Barbieri – via Beato Innocenzo n. 11 – Darfo Boario Terme – BS

COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE: Ing. Stefano Picciocchi – via Pesegata, 3 - Darfo Boario Terme – BS

IMPRESA APPALTATRICE: CO.E.F.” di Andrea Cottarelli &C. S.n.c., via Bernina n.40, Borno (Bs) – C.F. 02006250175;

ESECUZIONE DEI LAVORI

- La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 10/06/2022 a mezzo ordine di servizio da parte del Responsabile del procedimento;
- Il tempo utile per dare le opere ultimate, a seguito della proroga concessa, era fissato al 31/08/2022;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/07/2022

ITER PROGETTUALE, QUADRI ECONOMICI, AGGIUDICAZIONE LAVORI, CONTRATTI E SOMME AUTORIZZATE

Approvazione progetto: con la delibera n. 103 del 28.06.2022 sono stati approvati il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori ed individuata la copertura della spesa per realizzare gli interventi;

Affidamento: con verbale e perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in data 17/06/2022 prot. 5349 è stata individuata la ditta CO.E.F.” di Andrea Cottarelli &C. S.n.c., come esecutrice dei lavori di messa in sicurezza;

Approvazione: con la delibera n. 109 del 15/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, per l'importo netto di €. 101.546,43 compresi €. 3.449,10 per oneri della sicurezza;

Incarichi:

- Con determina n. 165 in data 13/06/2022 è stato affidato al sottoscritto ing. Marco Barbieri l'incarico per redigere il progetto esecutivo, la direzione dei lavori, la contabilità ed il rilascio del CRE;
- Con determina n. 166 in data 13/06/2022 è stato affidato al dott. geol. Feriti Gianpiero l'incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica;
- Con determina n. 170 in data 17/06/2022 è stato affidato al ing. Stefano Picciocchi l'incarico di collaudatore statico delle strutture;
- Con determina n. 171 in data 17/06/2022 è stato affidato al sottoscritto ing. Marco Barbieri l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

NOTIFICA PRELIMINARE DI APERTURA DEL CANTIERE

La notifica preliminare di apertura cantiere, ricorrendone le condizioni previste dal D.lgs 81/2008, è stata effettuata il 17/06/2022 numero. 68662/2022;

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Allo stato finale sono state completate tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo approvato;

E' stato tuttavia necessario introdurre alcune variazioni alle lavorazioni previste dal progetto, in particolare:

- Per la pavimentazione stradale si è deciso di non realizzare il tappeto di usura da 3 cm. ma unicamente lo strato di binder con spessore 14 cm a fronte dello strato di base; la corrispondente voce 13 è stata variata nella descrizione ed il prezzo unitario è quello del prezzario regionale (allegato 2 per il calcolo del costo unitario per lo spessore realizzato); di conseguenza nella contabilità finale la voce 14 del tappeto di usura compare con importo pari a 0,00;
- Non è stato modificato il pozzetto esistente di captazione dell'acqua a monte della strada e pertanto la voce 20 "Realizzazione di pozzetto per raccolta acqua ..." è posta pari a 0,00;
- Nelle voci 16, 17, 18 riferite al conferimento in discarica dei materiali di scavo o demolizione, sono state assunte le quantità risultanti dai formulari di trasporto in discarica forniti dall'impresa; le quantità sono in linea con quelle del progetto o inferiori;
- La voce n. 20 riferita alle analisi di laboratorio per i terreni di scavo è stata posta pari a 0,00 in quanto il materiale di scavo è stato conferito in discarica;
- È stata inserita la nuova voce 23 per quantificare la posa di 13 tubi di materiale plastico diametro 110 ed interasse 200 cm., sia alla base della fondazione che alla base del muro; il prezzo unitario utilizzato è quello del prezzario opere edili della regione Lombardia 2022;
- È stata inserita la nuova voce 24 per quantificare l'onere di noleggio di escavatore meccanico con operatore, utilizzato per mettere in evidenza i micropali di fondazione; il prezzo unitario utilizzato è quello del prezzario opere edili della regione Lombardia 2022;
- È stata inserita la nuova voce 25 per quantificare la manodopera utilizzata per i lavori di pulizia a mano dei micropali di fondazione e di scavo a mano in prossimità del tubo del gas metano; è stato infatti necessario metterlo in luce su tutta la lunghezza del fronte di scavo come da indicazioni ricevute dell'ente proprietario della rete; il prezzo unitario utilizzato è quello del prezzario opere edili della regione Lombardia 2022;
- Nella voce 26 riferita agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza l'importo è inferiore al progetto in quanto sono state contabilizzate le opere effettivamente realizzate, come risultante dalla sottostante tabella allegato 3;

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Non è stato necessario redigere una perizia suppletiva di variante

DEFINIZIONE DI NUOVI PREZZI

E' stato necessario concordare con l'impresa esecutrice cinque nuovi prezzi per lavorazioni non previste; i prezzi unitari sono stati dedotti dal prezzario regionale 2022;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore Lavori, in seguito ai riscontri e rilievi eseguiti in contraddittorio alla presenza del Legale Rappresentante dell'impresa Appaltatrice, ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 29 luglio 2022, pertanto entro il tempo utile contrattuale, considerando la proroga concessa.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Non vi sono comunicazioni che all'impresa esecutrice sia stato riconosciuta una anticipazione o uno Stato di avanzamento dei lavori;

STATO FINALE DEI LAVORI

La contabilità finale corrispondente allo STATO FINALE ed a chiusura della parte contabile, quantifica complessivamente PER LAVORI ALLO STATO FINALE € 67.295,53 calcolati con i prezzi fissati e quelli risultanti dalle lavorazioni aggiunte, compresi €. 2.718,59 per oneri per la sicurezza

È possibile concludere che va quindi riconosciuto all'Impresa Appaltatrice allo Stato Finale l'importo

complessivo di €. **67.295,53** (oltre IVA 22 %);

RISERVE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

La contabilità è stata redatta a misura e l'Impresa Appaltatrice ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva alcuna.

RATA DI SALDO

Nello schema seguente viene determinata la rata di saldo da corrispondersi all'Impresa Appaltatrice all'atto di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

PER LAVORI ALLO STATO FINALE con prezzi offerti	€	64.576,94
Oneri per la sicurezza	€.	2.718,59
- da cui detraendo i pagamenti emessi		
Certificato di pagamento n° 1	- €	0,00
- a dedurre penali	- €	0,00
- a dedurre manchevolezze	- €	0,00
- in aggiunta riserve	+ €	0,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€	67.295,53
Iva 22%	€.	14.805,02
Sommano compresa iva (22%)	€.	82.100,55

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

L'importo netto autorizzato dei lavori pari all'importo dell'affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza era pari ad €. 68.523,39 oltre IVA al 22%;

L'importo del Conto Finale dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre all'iva è di € 67.295,53, **pertanto inferiore** rispetto all'importo dei lavori ed oneri per la sicurezza previsto dal progetto;

Nel quadro economico generale dell'opera i risparmi sulle lavorazioni sono pertanto pari ad euro 1.227,86, oltre ad iva, inoltre non sono state utilizzate le somme destinate ad imprevisti.

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO			IMPORTI DA PROGETTO APPROVATO - AFFIDAMENTO	IMPORTI DA CONTABILITA' FINALE
A	Lavori		€ 65 074,29	€ 64 576,94
B	Oneri specifici di sicurezza		€ 3 449,10	€ 2 718,59
IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			€ 68 523,39	€ 67 295,53
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Spese tecniche				
Progettazione, direzione dei lavori, coordinatore in fase di progetto e di esecuzione, contabilità, Certificato di regolare esecuzione				
Somma		7 024,65 €		
Cassa 4%		280,98 €		
Iva 22% - non soggetto				
Totale		7 305,63 €		
Totale spese tecniche			€ 7 305,63	€ 7 305,63
Contributo ANAC			€ 30,00	€ 30,00
Quota responsabile unico del procedimento art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (inclusa spesa IRAP) (2%)				
Indennizzo per acquisizione aree				
Relazione geologica			€ 1 268,80	€ 1 268,80
Spese per collaudo delle strutture compresa cassa ed iva			€ 1 268,80	€ 1 268,80
Risparmi su minori lavorazioni, compresa iva				€ 1 497,99
Imprevisti			€ 8 074,66	€ 8 074,66
IVA sui lavori e oneri per la sicurezza all'aliquota del 22%		22%	€ 15 075,15	€ 14 805,02
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 33 023,04	€ 34 250,90
A+B+C	IMPORTO DEL PROGETTO (come da delibera G.C. n. 109 del 15.07.2022)		101 546,43 €	€ 101 546,43

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI E VERIFICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI SULLE IMPRESE ESECUTRICI

L'Impresa ha le seguenti posizioni assicurative:

Posizione INPS: **1514136597**

Posizione INAIL: **4377332**

Cassa Edile: **BS-15739**

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il corso dei lavori **non risulta essersi verificato alcun infortunio.**

GARANZIA FIDEJUSSORIA

Per la stipulazione del suddetto contratto all'impresa non è stata richiesta la presentazione di garanzia fidejussoria.

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PER L'ESECUZIONE E LA RESPONSABILITA' CIVILE

L'impresa ha stipulato polizza assicurativa numero 361150901 con la società assicurativa GENERALI per responsabilità civile per un massimale R.C.T. di euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, euro 1.000.000,00 per ogni persona ed euro 1.000.000,00 per danni a cose.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori **non si sono avuti danni di forza maggiore.**

CESSIONI DI CREDITI

Non risultano comunicazioni alla direzione dei lavori che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei suoi crediti

fatta salva la finale verifica di atti superiori in capo alla Stazione Appaltante.

ANDAMENTO DEI LAVORI, VARIAZIONI APPORTATE E RICHIESTE INTERVENTI FINALI

Relativamente all'andamento dei lavori, gli stessi hanno seguito le dinamiche e le condizioni previste dal progetto nei limiti di modifica dei poteri discrezionali della Direzione Tecnica dei Lavori e delle impartizioni di vincoli autorizzativi superiori, nonché di talune difficoltà operative incontrate, e tenendo sempre in considerazione l'urgenza di mettere in sicurezza e riaprire nei tempi stabiliti la strada pubblica;

RIFERIMENTI DOCUMENTALI

Tutta la documentazione di rito è integralmente protocollata presso la Stazione Appaltante.

SUBAPPALTI

Sono state subappaltate le lavorazioni per la posa dei micropali di fondazione, categoria SOA OS21

BONARI ACCORDI

Non sottoscritti

COLLAUDO STATICO

Necessario per chiudere la denuncia di opere in zona sismica; i risultati delle prove di laboratorio redatte dal laboratorio CPM di Bienno per la verifica di resistenza dei provini di calcestruzzo prelevati dalla fondazione e dal muro ha confermato la messa in opera di calcestruzzo con le caratteristiche prevista dal progetto.

QUALITA' DEI MATERIALI IMPIEGATI

Acciaio per micropali: tubo diametro 127 mm. e spessore 8 mm, classe S355JOH

Betoncino per micropali: RS 30 prodotto dalla ditta Fassa Bortolo, specifico per riempimento di cavità di murature e in lavori di consolidamento in genere, micropali, ecc.

Acciaio per ca: prodotto da azienda certificate, tipo B450C

Calcestruzzo: classe di resistenza C28/35

AVVISI AI CREDITORI

L'avviso ai creditori previsto dall'art. 218 D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo online dal 31/08/2022 al 30/09/2022 senza osservazioni.

CONCLUSIONI

- Richiamati interamente i contenuti della Relazione sullo Stato Finale del 25.08.2022
- Considerato che per appalti fino a Euro 500.000,00 il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.
- Verificato che in base all'articolo 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Convocata la Visita di Collaudo in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice il 29/07/2022 il sottoscritto Dott. ing. Marco Barbieri – Direttore Lavori ed il rappresentante dell'Impresa Appaltatrice si sono quindi trovati sul posto per effettuare le previste verifiche in contraddittorio.

Sulla scorta del progetto e della perizia di variante, del contratto e degli atti di liquidazione contabile – sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso per la verifica delle realizzazioni oggetto di contratto, rilevando quanto segue:

- le opere eseguite si presentano attualmente in condizioni di normalità e di efficienza;
- i lavori sono stati compiuti secondo la buona regola d'arte, con idonei magistri e con materiali corrispondenti alle funzioni a cui sono stati preposti;
- eventuali variazioni delle caratteristiche dei materiali forniti sono state ritenute tecnicamente idonee e

comunque documentate;

- l'intervento è stato eseguito secondo le previsioni progettuali ed ai patti contrattuali approvati nei limiti di modifica dei poteri discrezionali della Direzione Tecnica dei lavori e delle prescrizioni di vincoli autorizzativi superiori;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa Appaltatrice ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'articolo 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- nessun infortunio è stato lamentato nel corso dei lavori;
- l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC protocollo INAIL n° 33659969 con scadenza 25/10/2022, allegato;
- che dalla operata revisione contabile non è emersa la necessità di rettificare l'importo finale di € **67.295,53** compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, il quale viene pertanto riconfermato;
- che le somme spese sono contenute in quelle autorizzate;
- che a norma delle vigenti disposizioni di legge il Direttore Lavori può rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione;
- che il collaudatore ha depositato il collaudo statico con esito favorevole

Vista e richiamata inoltre:

- tutta la documentazione di rito costituente lo storico di riferimento per l'opera e consegnata agli atti della Stazione Appaltante quale parte indissolubile del presente documento e dell'opera stessa;
- tutto il depositato agli atti della Stazione Appaltante inerente il presente lavoro;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore Lavori certifica che i lavori di cui in epigrafe, eseguiti dall'Impresa come da contratto, sono collaudabili e pertanto rilascia il presente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

liquidando il credito dell'Impresa come segue:

Nello schema seguente viene determinata la rata di saldo da corrispondersi all'Impresa Appaltatrice all'atto di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Nello schema seguente viene determinata la rata di saldo da corrispondersi all'Impresa Appaltatrice all'atto di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

PER LAVORI ALLO STATO FINALE con prezzi di affidamento	€	64.576,94
Oneri per la sicurezza	€.	2.718,59
- da cui detraendo i pagamenti emessi		
Certificato di pagamento n° 1	- €	0,00
- a dedurre penali	- €	0,00
- a dedurre manchevolezze	- €	0,00
- in aggiunta riserve	+ €	0,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€	67.295,53
Iva 22%	€.	14.805,02
Sommano compresa iva (22%)	€.	82.100,55

Rimane quindi a credito netto dell'impresa €. **67.295,53** **(diconsi sessantasettemiladuecentonovantacinque/53), oltre ad iva per complessivi €.** **82.100,55** **iva compresa;**

Si svincola la eventuale cauzione definitiva, se depositata, salvo la superiore approvazione del presente certificato da parte della Stazione Appaltante ed a seguito delle ulteriori verifiche di legge. Dal che si può intendere riconsegnata area e opera.

Allegati:

- Formulare dei materiali di scavo e demolizione recapitati in discarica

Il Direttore dei Lavori
Dott. ing Marco Barbieri

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33659969	Data richiesta	27/06/2022	Scadenza validità	25/10/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.E.F. DI ANDREA COTTARELLI E C. S.N.C.
Codice fiscale	02006250175
Sede legale	VIA BERNINA, 40 25042 BORNO (BS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FORMULARI DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN CENTRI DI RACCOLTA AUTORIZZATI

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc
 Trasporti conto terzi, Movimento terra, Sgombrò neve, Nettezza urbana
 Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
 Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
 Mail: coefsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
 C.F.: 02006250175 P.IVA: 00671600989

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. **13** del **11/08/2022**

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

BETTONI 4.0 SR
LOC. FORNO FUSORIO
AZZONE (BC)


LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

BETTONI 4.0 SR
CERSTO (BC)

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONFERIMENTO A DISCARICA

VS. ORD. N. DEL in conto a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
MC 10	MATERIALE TERRE E ROCCE NON PERICOLOSE	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA 11/08/2022 ORA 07:30	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Ah</i>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

CEDEnte: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc
 Trasporti conto terzi, Movimento terra, Sgombro neve, Nettezza urbana
 Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
 Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
 Mail: coeofsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
 C.F.:02006250175 P.IVA: 00671600989

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 15 del 12/08/2022

a mezzo:

vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

BETTONI 4.0 SR
LOCALITA' FORNO FUSARIO
AREONE (BC)

BETTONI 4.0 SR
CERETE (BC)

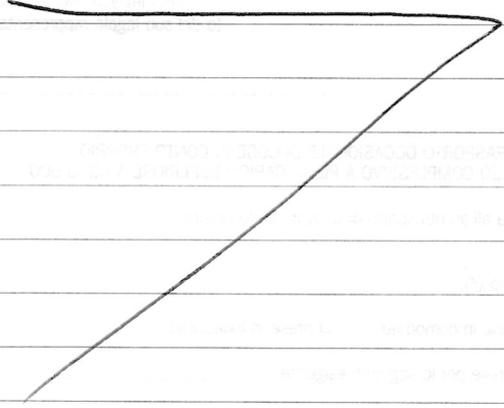
CAUSALE DEL TRASPORTO

CONFERIMENTO A DISCARICA


VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	<u>MC 10 MATERIALE TERRE E ROCCE</u> <u>NON SENSIBILE</u>	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA <u>12/08/22</u> ORA <u>10.00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

CEDEnte: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc
 Trasporti conto terzi, Movimento terra, Sgombrò neve, Nettezza urbana
 Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
 Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
 Mail: coefsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
 C.F.: 02006250175 P.IVA: 00671600989

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. **17** del **16/08/2022**

a mezzo:

vettore cedente cessionario


CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

BETTONI 4.0 SPL
LOCALITA' FONDO FUSARIO
AZZONE (BS)
 CAUSALE DEL TRASPORTO
CONFERIMENTO A DECARICA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

BETTONI 4.0 SPL
CERESTE (BG)

VS. ORD. N. DEL in conto a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	INCLO MATERIALE DA SCAVO TERRO E ROCCE NON PERICOLOSE	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 16/08/2022	ORA 14:40	FIRMA DEL CEDENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc

DOCUMENTO DI TRASPORTO

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc
Trasporti conto terzi, Movimento terra, Sgombrò neve, Nettezza urbana
Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
Mail: coefsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
C.F.:02006250175 P.IVA: 00671600989

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 19 del 17082022

a mezzo:

vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

BETTONI 4.0 SRL
LOC. FORNO FUSARIO
AZZANE (bc)

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

BETTONI 4.0 SRL
CERESTE (BC)

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONFERIMENTO A DISCARICA

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO (1)

MX 10 MATERIALE DA SCAVO TERRO E
ROCCHE NON PERICOLOSA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

18700

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

1708221330

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc

DOCUMENTO DI TRASPORTO

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc
 Trasporti conto terzi, Movimento terra, Sgombrò neve, Bellezza urbana
 Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
 Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
 Mail: coefsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
 C.F.: 02006250175 P.IVA: 00671600989

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 20 del 18/08/2022

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

BETTONI 4.0 SR
LOC. FORNO FUSARIO
AZZONE (BG)

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

BETTONI 4.0 SR
CERESSE (Ba)

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONFERIMENTO A DISCARICA

VS. ORD. N. _____ DEL _____ in conto a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	<u>Mc 7 TATERIALE DA SOTTO TERRE E</u> <u>ROCCHE NON PERICOLOSE</u>	
/		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VLSBA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza _____ DATA E ORA DEL RITIRO _____ FIRME _____

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario DATA 18/08/22 ORA 10:10 FIRMA DEL CEDENTE _____

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI _____ NUMERO PROGRESSIVO _____ FIRMA DEL CESSIONARIO _____

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

11/08/2022

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

COMUNE DI BORNO

Unità Locale

BORNO
VIA ROCCA

Cod. fisc.

09791670176

N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

BETTONI 4.0 SRL

Luogo di Destinazione

CERETE
LOC. FOPPALEONE

Com. Art. 216 D. Lgs 152/2006 del 12/06/2013

Cod. fisc.

04315880163

N. Autorizz. / Albo

Prot. 59381

12 06 13

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc

Indirizzo

Trasporti conto terzi, Movimento terra, Sgombero neve, Nettezza urbana
Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
Mail: coebsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
C.F.:02006250175 P.IVA: 00671600989

Cod. fisc.

11000537/05

N. Autorizz. / Albo

del

28 07 06

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

BORNO Via Rocca

ANNOTAZIONI

VALUTAZIONE del RIFIUTO ESSEGUITO AI SENSI DELLA
DECRETO 206/1955/UE (RIFIUTO NON PERICOLOSO)
PROVENIENTE da ATTIVITA' DESTINATO al USO
PRODOTTO.
Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc
Trasporti conto terzi, Movimento terra, Sgombero neve, Nettezza urbana
Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
Mail: coebsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
C.F.:02006250175 P.IVA: 00671600989

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

Cemento

CODICE del RIFIUTO (*)

CER 110101

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

1

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

P. lordo

Tara

Kg.

Litri

14000

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Cottarelli Andrea

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

BX364NW

Targa rimorchio

Cognome e Nome
Conducente

COTTARELLI ANDREA

Data e Ora Inizio trasporto

11/08/2022

15:00

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

14000

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data


11/08/2022

Ora

16:00

Firma del Destinatario

BETTONI 4.0 SRL
CERETE
LOC. FOPPALEONE



DUE 298643 /19

(*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014). - Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

Gruppo Biffari S.p.A. Via Poggio Casone, 21 - 00173 Roma - Sede Operativa in Borno, Via S. Pambola, Via dei Turchetti, 48 - Azienda Agricola della Frattina n. 2009/1/206 del 09/11/2009
PRIMA SEZIONE
SECONDA SEZIONE
TERZA SEZIONE
QUARTA SEZIONE
QUINTA SEZIONE
VIOLAZIONE

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

11/08/2022

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **COMUNE DI BORNO**

Unità Locale **BORNO VIA Rocca**

Cod. fisc. **00701670176**

N. Aut./Albo

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **BETTONI 4.0 SRL**

Luogo di Destinazione **CERETE LOC. FOPPALEONE**

Com. Art. 216 D. Lgs 152/2006 del 12/06/2013

Cod. fisc. **0431588063**

N. Autorizz. / Albo

Prot. 59381

12 06 13

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc**

Indirizzo

Trasporti conto terzi. Movimento terra. Sgombro neve. Nettezza urbana
**Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
Mail: coefsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
C.F.: 02006250175 P.IVA: 00671600989**

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

M1000547/05

del 28/07/06

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di **BORNO Via Rocca**

ANNOTAZIONI

AUTORIZZAZIONE DEL RIFIUTO ESEGUITO AI SENSI DELLA
DECISIONE 2014/18/UE SPECIALE NON PERICOLOSO
PROVENIENTE DALLA ATTIVITA' DI PRODUZIONE DESTINATO AL USO
PRODOTTO

Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc
Trasporti conto terzi. Movimento terra. Sgombro neve. Nettezza urbana
**Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
Cell. 340.8275562 - Cell. 335.8411580
Mail: coefsnc@alice.it ISD: USAL 8 PV
C.F.: 02006250175 P.IVA: 00671600989**

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **CERETE**

CODICE DI RIFIUTO (*)

CERTE 110102

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

1

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

Unità

Kg. Litri

14000

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

Bx 364 NUC

Targa rimorchio

Cognome e Nome
Conducente

COTTARELLI ANDREA

Data e Ora Inizio trasporto

11/08/2022 11:00

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg. Litri

14000

Respianto per le seguenti motivazioni:


11/08/2022

Ora

11:00

Firma del Destinatario

**BETTONI 4.0 SRL
CERETE
LOC. FOPPALEONE**



DUE 298644 /19
(*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/1955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014) - Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

29/06/2022

DUE 298642 /19

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale COMUNE DI BORNO
Unità locale Borno
A Rocca
Cod. Fisc. 00751670176 N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale AVANZINI COSTRUZIONI SRL BIELLO BS
Luogo di Destinazione VIA DEI CADUTI 106 BERZO INF
Cod. Fisc. 03094200984 N. Autorizz. / Albo 838 del 02/03/21

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc**
Trasporti conto terzi, Movimento terra, Spuntare neve, Netzezza urbana
Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)
Cell. 340.8275562 - Cell. 335.3411580
Mail: coefanc@alice.it ISD: USAL 8 PV
C.F.:02006250175 P.IVA: 00671600988
Cod. Fisc. _____ N. Autorizz. / Albo M1000547/05 del 28/07/06
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di Borno

ANNOTAZIONI

Valuta **Co.e.f di Andrea Cottarelli e C snc** QUITO AI SENSI DELLA
DECISIONE **Trasporti conto terzi, Movimento terra, Spuntare neve, Netzezza urbana** SPECIALE NON PERICOLOSO
PRODOTTORE **Via Bernina, 40 - 25042 BORNO (Bs)** IN DESTINATO AD USO
PRODOTTO **Cell. 340.8275562 - Cell. 335.3411580**
Mail: coefanc@alice.it ISD: USAL 8 PV
C.F.:02006250175 P.IVA: 00671600988

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTO DA DETRIZIONI E COSTRUZIONI

CODICE del RIFIUTO(*) 201304 STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____ N. COLLI/CONTENITORI 1

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento POS

6 QUANTITÀ

Kg. 1020
 Litri _____
 Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve _____

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

[Signature] Cottarelli Andrea

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo BX364 MW Targa rimorchio _____
Cognome e Nome COTTARELLI ANDREA Data e Ora Inizio trasporto 29/06/2022 11:30

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: 12360
 Respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data 29/06/2022 Ora 13:50

Firma del Destinatario [Signature]



Gruppo Editoriale L'Espresso - Via Filippo Cavallotti, 33 - 00144 Roma - Sede Operativa in Roma, Via B. Passolunghi, 40 - Aut. Min. Giust. Roma n. 111/1000 - SECONDA SEZIONE - TERZA SEZIONE - QUARTA SEZIONE - MODELLO CONFORME - VERIFICAZIONE

(*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014) - Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

NOTE



25040 **BIENNO** (Brescia) - Via Mazzini, 32
Tel. e Fax 0364 40588 - e-mail: info@avanzinicostruzioni.it
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03091200984
Unità locale: viale Caduti, 106 - Berzo Inferiore (Brescia)

ENTRATA

DATA ENTRATA 29/06/2022	ORA ENTRATA 13:51	N° PROGRESSIVO 28036
TARGA	MERCE	
CLIENTE/FORNITORE		
N° MEMORIA	PESO ENTRATA	

USCITA

DATA USCITA 29/06/2022	PESO USCITA 26360 Kg
ORA USCITA 13:51 PT	PESO ENTRATA 13500 Kg
RICHIAMO MEMORIA M	PESO NETTO 12860 Kg
