


Comune:	Capo di Ponte
Lavori:	Manutenzione forestale Seradina-Bedolina Capo di Ponte
Finanziamento:	Valle dei Segni
Importo:	€ 50.000,00
Descrizione:	I lavori hanno comportato una manutenzione programmata e sostenibile dell'arte rupestre e dei contesti ambientali che la accolgono (vegetazione, e non solo) in uno scambio sinergico tra documenti archeologici, forestali ed ambientali. Il lavoro si è articolato attraverso interventi forestali per la gestione puntuale del patrimonio forestale in ambito archeologico, interventi di manutenzione sulle infrastrutture del Parco ed interventi di restauro e di manutenzione di rocce incise su restauri già effettuati.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 17/02/2025 e sono terminati il 13/06/2025



Comune:	Capo di Ponte
Lavori:	Regimazione idraulica torrenti Deria località Gambarere Lotto 1 Capo di Ponte
Finanziamento:	RIM
Importo:	€ 23.061,29
Descrizione:	I lavori hanno comportato la realizzare gli interventi di regimazione idraulica di alcune porzioni della valletta in località Gambarere, le opere principali sono state lo svaso dell'alveo, la realizzazione di scogliere spondali in massi a secco, la realizzazione di scogliere spondali in massi con paramento posteriore in cls e la realizzazione di muretto di contenimento in cls per ridefinire un tratto di canalizzazione intasato.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 17/03/2025 e sono terminati il 06/05/2025

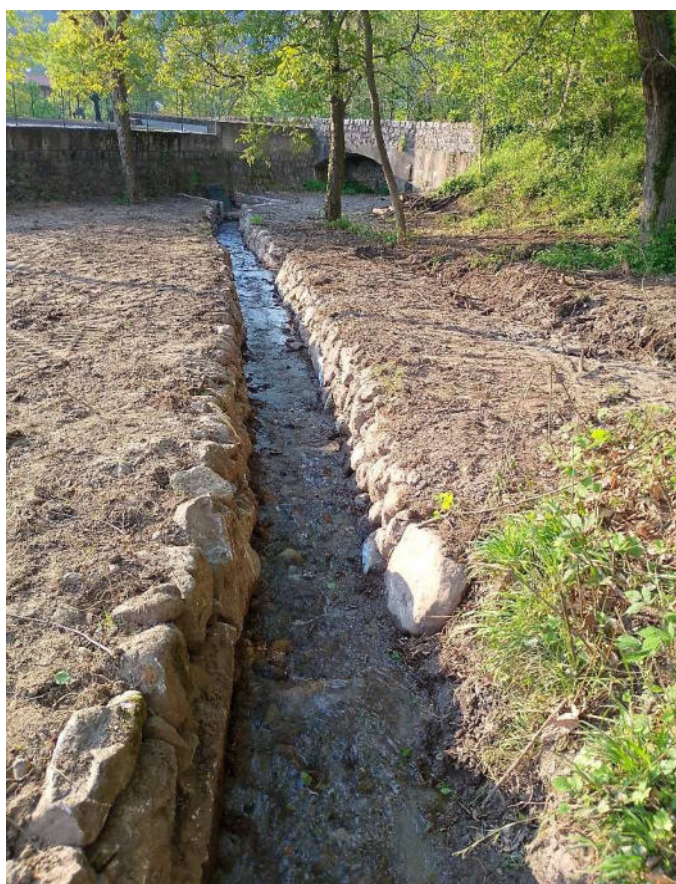


Comune:	Capo di Ponte
Lavori:	AIB località GAS Capo di Ponte
Finanziamento:	Comunità Montana di Valle Camonica
Importo:	€ 20.000,00
Descrizione:	I lavori hanno comportato la manutenzione straordinaria della presa dell'acquedotto AIB sulla valle del Piloeh, mediante la realizzazione di un piccolo sbarramento in muratura, vasca di carico con griglia metallica ed allacciamento al serbatoio esistente. Si è provveduto inoltre alla realizzazione di un tratto di acquedotto tra la vasca di Bleghen e la località Gas, mediante posa di tubo PEAD da 63 mm e stacchi attrezzati con bocchette AIB UNI 45.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 23/07/2025 e sono terminati il 30/09/2025



Comune:	Comune di Capo di Ponte
Lavori:	Interventi di potenziamento dei sistemi di stoccaggio e di distribuzione delle acque nel comparto pascolivo della malga Vericolo Capo di Ponte
Finanziamento:	Bando Piccoli Bacini 2023
Importo:	€ 44.138,33
Descrizione:	Gli interventi hanno comportato la realizzazione di uno sbarramento in muratura a chiusura della valletta a monte dei fabbricati della malga Vericolo, al fine di creare un bacino artificiale per la raccolta dell'acqua piovana e di scorrimento superficiale. Inoltre si è provveduto alla fornitura e posa di un serbatoio interrato per lo stoccaggio dell'acqua, ed alla realizzazione di condotta di collegamento tra l'invaso ed il serbatoio;
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 25/09/2025 e sono terminati il 05/11/2025






Comune:	Comune di Cervo
Lavori:	Messa in sicurezza strada Monte Arsio Cervo
Finanziamento:	Regione Lombardia
Importo:	€ 155.400,00
Descrizione:	Gli interventi hanno comportato la la realizzazione di numerosi tratti di pavimentazione in battuto di cemento, la posa in opera di pannelli consolidatori a farfalla per ripristino di un versante franoso sottostrada in località Gibeza, la realizzazione di barriere con profilati in acciaio HEA 120 verniciate color testa di moro e correnti in legname, di tipologia analoga a quelle esistenti.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 16/05/2025 e sono in fase di ultimazione

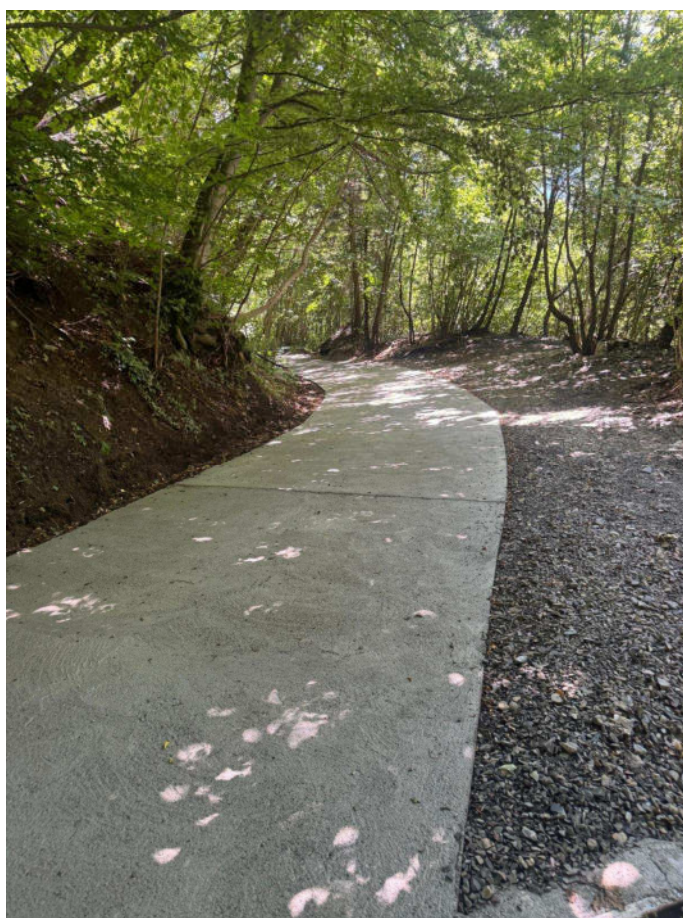

Comune:	Comune di Cervo
Lavori:	Interventi di ripristino e potenziamento dei sistemi di adduzione e distribuzione delle acque nel comparto pascolivo delle malghe Campione ed Erbigno Cervo
Finanziamento:	Bando piccoli Bacini 2023
Importo:	€ 68.009,33
Descrizione:	Gli interventi hanno comportato la sostituzione delle condotte idriche a servizio dei fabbricati d'alpe mediante interrimento manuale, la realizzazione di fontane/abbeveratoio costituite da vasche in acciaio inox rivestite in muratura di pietrame e cemento.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 17/09/2025 e sono terminati il 25/11/2025



Comune:	Comune di Malonno
Lavori:	Recupero miniera Ferromin Malonno
Finanziamento:	L.R. 9/2020
Importo:	€ 138.476,03
Descrizione:	I lavori hanno comportato la realizzazione dell'impianto elettrico di illuminazione e di sicurezza all'interno delle gallerie, la posa di faretti scenografici in prossimità dei punti di maggior interesse. Nella parte esterna sono stati realizzati due edifici nella zona bassa nei pressi dell'ingresso miniera, con struttura in legno Xlam, che serviranno come centro accoglienza e magazzino a supporto delle attività. Sulla strada di accesso sono stati manutentati i muri a secco ed è stata posata la barriera di protezione in legname. Si è proceduto al restauro del rudere nella parte alta.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 30/12/2022 e sono terminati il 31/03/2025

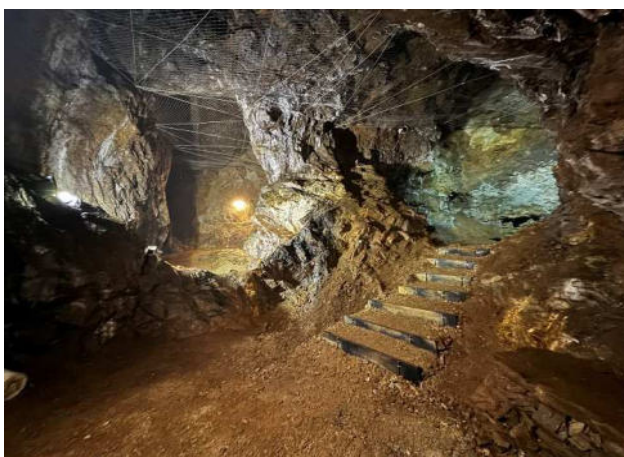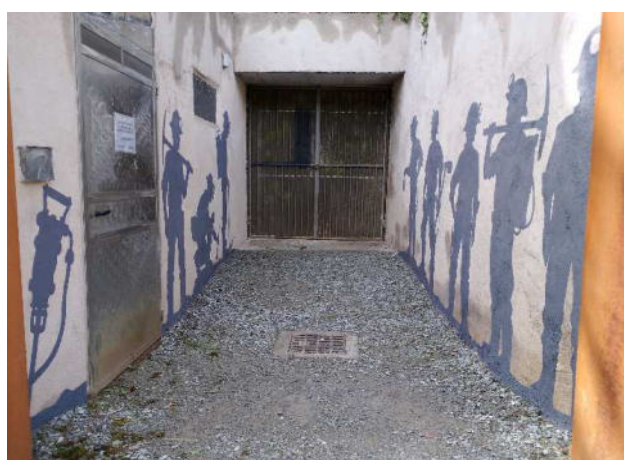

Comune:	Comune di Malonno
Lavori:	Riqualificazione malga didattica Campello di Landò 7.5.01 Malonno
Finanziamento:	PSR 2014-2020 misura 7.5.01
Importo:	€ 56.987,40
Descrizione:	I lavori hanno comportato il miglioramento dei fabbricati d'alpe afferenti alla malga Campello di Landò, e precisamente: adeguamento dell'edificio principale della malga che sarà destinato a struttura ricettiva, con realizzazione di bagni, zona mensa, nuova cucina, posa di serramenti in legno, arredamenti per camere da letto, rifacimento tetto e impianto elettrico-sanitario; nell'edificio stalla, realizzazione di bagno e locale adibito alla trasformazione del latte.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 20/06/2024 e sono terminati il 13/06/2025





Comune:	Malonno
Lavori:	Interventi di ripristino e potenziamento dei sistemi di adduzione e distribuzione delle acque nel comparto pascolivo del Campello di Landò e nell'area rurale delle Fontane, Paghera e Bronò Malonno
Finanziamento:	Bando Piccoli Bacini 2023
Importo:	€ 76.288,27
Descrizione:	I lavori hanno comportato la realizzazione dell'acquedotto rurale tra le loc. Carbunarola e Bronò, l'adeguamento delle vasche di accumulo esistenti (impermeabilizzazione interna ed esterna, rivestimenti in muratura, ripristino delle recinzioni, realizzazione di porte di accesso e scalette in acciaio inox), la pulizia delle prese e la realizzazione di un serbatoio interrato a servizio della malga Campello di Landò.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 28/07/2025 e sono terminati il 17/10/2025



Comune:	Ono San Pietro
Lavori:	SIF Plemort Ono San Pietro
Finanziamento:	L.R.9/2020
Importo:	€ 73.785,03
Descrizione:	I lavori hanno comportato la regimazione del torrente Plemort ed il consolidamento spondale nel tratto immediatamente a valle della strada asp del Monte di Ono mediante il taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto, la realizzazione scogliere spondali in massi a secco per il consolidamento e la difesa contro l'erosione spondale, la realizzazione di briglie e soglie in pietrame e cls, la formazione di selciato di fondo con massi a secco a valle delle briglie e delle soglie con funzione di dissipatore, il rivestimento delle scarpate con biostuia in cocco successivamente inerbita.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 24/07/2023 e sono terminati il 18/09/2025



Comune:	Paisco Lovenò
Lavori:	Realizzazione strada ASP Alben-Stoplà Paisco Lovenò
Finanziamento:	L.R.9/2020
Importo:	€ 74.515,65
Descrizione:	I lavori hanno comportato l'allargamento della sede stradale esistente mediante sterri e riporti e la realizzazione di palificate doppie in legname nei tratti dove il versante è maggiormente ripido, al fine di evitare il ristagno idrico nei tratti pianeggianti che attraversano le aree pascolive, si resa necessaria la formazione di una massicciata stradale mediante posa di materiale arido (spezzato di cava). A completamento delle opere sono stati realizzati un cunettone stradale in selciato di pietrame a secco e la posa di canalette trasversali per lo smaltimento delle acque di scorrimento superficiale.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 24/07/2023 e sono terminati il 18/09/2025

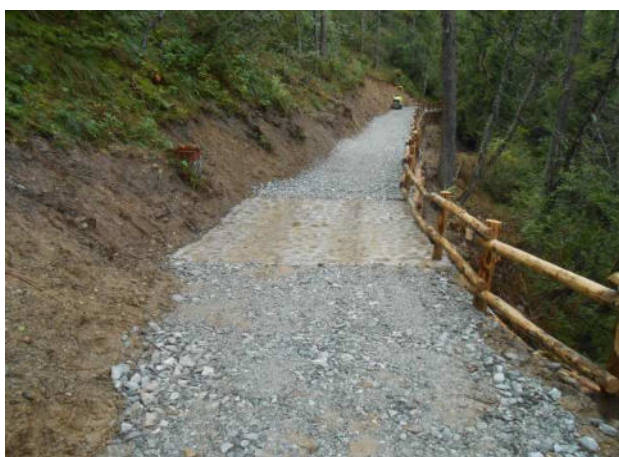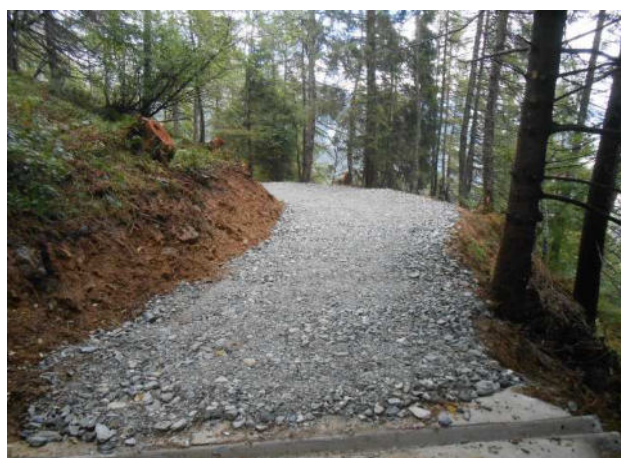


Comune:	Paisco Lovenò
Lavori:	Ripristino strada Sparsinica Paisco Lovenò
Finanziamento:	OCDPC
Importo:	€ 107.600,00
Descrizione:	I lavori, per l'anno in corso, hanno comportato il ripristino di alcune murature in pietrame instabili e la pavimentazione di alcuni tratti in selciato di pietrame e cls.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 04/07/2024 e sono in fase di ultimazione



Comune:	Paisco Lovenò
Lavori:	Bonifica forestale Vaia 4 Paisco Lovenò
Finanziamento:	OCDPC
Importo:	€ 292.040,00
Descrizione:	Quarto piano d'intervento, che permetterà di effettuare il completamento della bonifica forestale già avviata nei primi anni successivi alla Tempesta Vaia; gli interventi sono indirizzati a completare le operazioni di bonifica in località Casola (pf 36 e 37) nelle aree a monte del Canale e dei Bacini ENEL e lungo i versanti della Val di Scala (pf 25, 27, 31 e 32). Le operazioni hanno comportato il taglio, sramatura e depezzamento delle piante danneggiate ed il successivo esbosco con elicottero del materiale legnoso.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 23/10/2023 e sono in fase di ultimazione



Comune:	Sellero
Lavori:	Manutenzione forestale-ripristini Carpene Sellero
Finanziamento:	Valle dei Segni
Importo:	€ 18.237,00
Descrizione:	I lavori hanno comportato la sostituzione della scalinata di accesso e la ricostruzione completa della passerella in legno sulla roccia 2, la manutenzione della palificata di contenimento del sentiero soprastante la roccia 2, il ripristino dei camminamenti e delle scale nell'area di visita delle rocce sotto strada.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 31/03/2025 e sono terminati il 16/12/2025

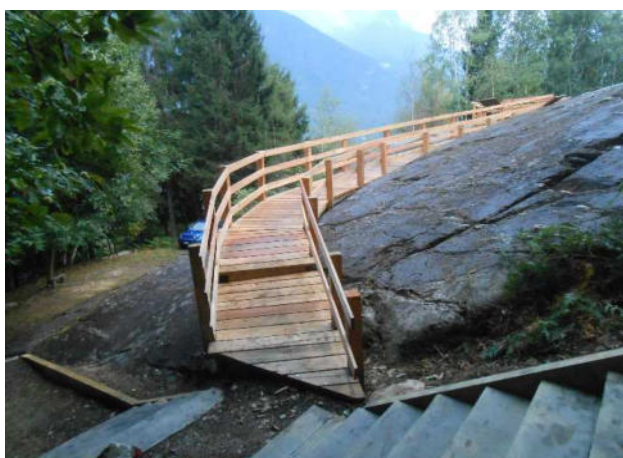

Comune:	Sellero
Lavori:	Manutenzione forestale Carpine Sellero
Finanziamento:	Valle dei Segni
Importo:	€ 27.000,00
Descrizione:	I lavori hanno comportato una serie di interventi di taglio per la valorizzazione fisionomico-strutturale finalizzata alla massimizzazione delle funzioni del soprassuolo. Ogni singola operazione è stata oggetto di meticoloso contrassegno preventivo al fine di garantire la continuità d'obiettivo nel medio periodo. Oltre al taglio e l'accatastamento ordinato dei residui di lavorazione boschiva, sono state effettuate una serie di potature di risanamento e degli abbattimenti controllati di soggetti pericolosi di seguito esboscati con l'ausilio dell'elicottero.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 31/03/2025 e sono terminati il 16/12/2025



Comune:	Sellero
Lavori:	Interventi di ripristino e manutenzione del piccolo bacino idrico e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle acque della malga Tambione Sellero
Finanziamento:	Bando piccoli Bacini 2023
Importo:	€ 75.480,00
Descrizione:	I lavori sono stati finalizzati al miglioramento dell'efficienza del bacino di stoccaggio dell'acqua piovana, da utilizzare sia per l'attività agricola d'alpe che per la struttura ricettiva, le opere hanno comportato il ripristino dell'impermeabilizzazione del fondo del bacino, l'adeguamento del sistema di alimentazione e scarico del bacino, il ripristino della staccionata perimetrale e la manutenzione ed adeguamento della strada di accesso.
Stato dei lavori:	I lavori sono iniziati il 24/09/2025 e sono terminati il 12/12/2025

